

§ 51 D

Dnr 1981.517

3011

Messlingen 3:50 - Bertil Fahlström, Kungsgatan 18, 111 35
Stockholm.

Ansökan om byggnadslov för VA-installation.

VA-inspektör Stig Holm är delegerad att fatta beslut i
ärendet.

Byggnadsnämnden beslutar

att bevilja sökt byggnadslov,

att godkänna John Pettersson som ansvarig arbetsledare,

att då byggnadsföretaget anmäls som färdigställt för bygg-
nadsnämndens slutavsyning skall bevis över utförd besiktning
av VA-installation (provtryckning) bifogas.

Sign

Beslutexpediering

VA-installation

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens tekniska granskning vid ansökan om byggnadslov.

TEKNISK ÖVERSIKTSBESKRIVNING

Datum

1982.01.20

Beskrivningen avser installation		
☒ i nybyggnad	☐ i tillbyggnad	☐ vid ombyggnad
Hustyp (enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus etc)	Antal hus	Antal lägenheter
FRITIDSHUS	1	1
Kommun	Länsbokstav	Fastighetsbeteckning
HÄRJEDALEN	Z	MESSLINGEN 3:50
Fastighetsadress (gatadress eller motsvarande)		
Sökandens namn, adress och telefon		

HÄRJEDALENS KOMMUN
Byggnadsnämnden**Vatteninstallation**

1982 02 12

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Höjdläge för högsta vattenuttag, m
0.5	Dnr. 1981. 517 3011
Lägsta tryck i förbindelsepunkt, m H ₂ O	Högsta tryck i förbindelsepunkt, m H ₂ O
BER. P ₀ = 10-20	
Tryckreduktion	Tryckstegring
☐ Ja ☒ Nej	☐ Ja ☒ Nej
Antal nya tappställen	Antal nya brandposter
4 ST	
Anslutning till	
☐ allmän anläggning	☒ enskild gemensamhetsanläggning
☐ egen anläggning	

Avloppsinstallation

Spillvatten		
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Höjdläge för lägsta avloppsenhet, m	Antal nya avloppsenheter
		4 ST
Anslutning till		
☐ allmän anläggning	☒ enskild gemensamhetsanläggning	☐ egen anläggning
Regnvatten (dagvatten)		
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s		
Anslutning till		
☐ allmän anläggning	☒ mark	
Dränvatten		
Lägsta utloppshöjd på dränledning, m		
Anslutning till		
☐ regnvattenledning	☒ Annan anslutning	MARU

Övriga upplysningar

Utförande av installationen typgodkänd	Dimensionering av installationen enligt
☐ Ja ☒ Nej	☒ schablonmetod ☐ beräkningsmetod

Allmänna upplysningar

Ej obligatoriska uppgifter


Entreprenör för VA-installationen
RÖR AB OLJA & SANITET, FUNÄSDALEN
Ansvarig arbetsledare
Konstruktör
RÖR AB, OLJA & SANITET, FUNÄSDALEN

År 1982 den 5/3 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 51 D. betygas:

Sökandens underskrift

X

Ac. Foran

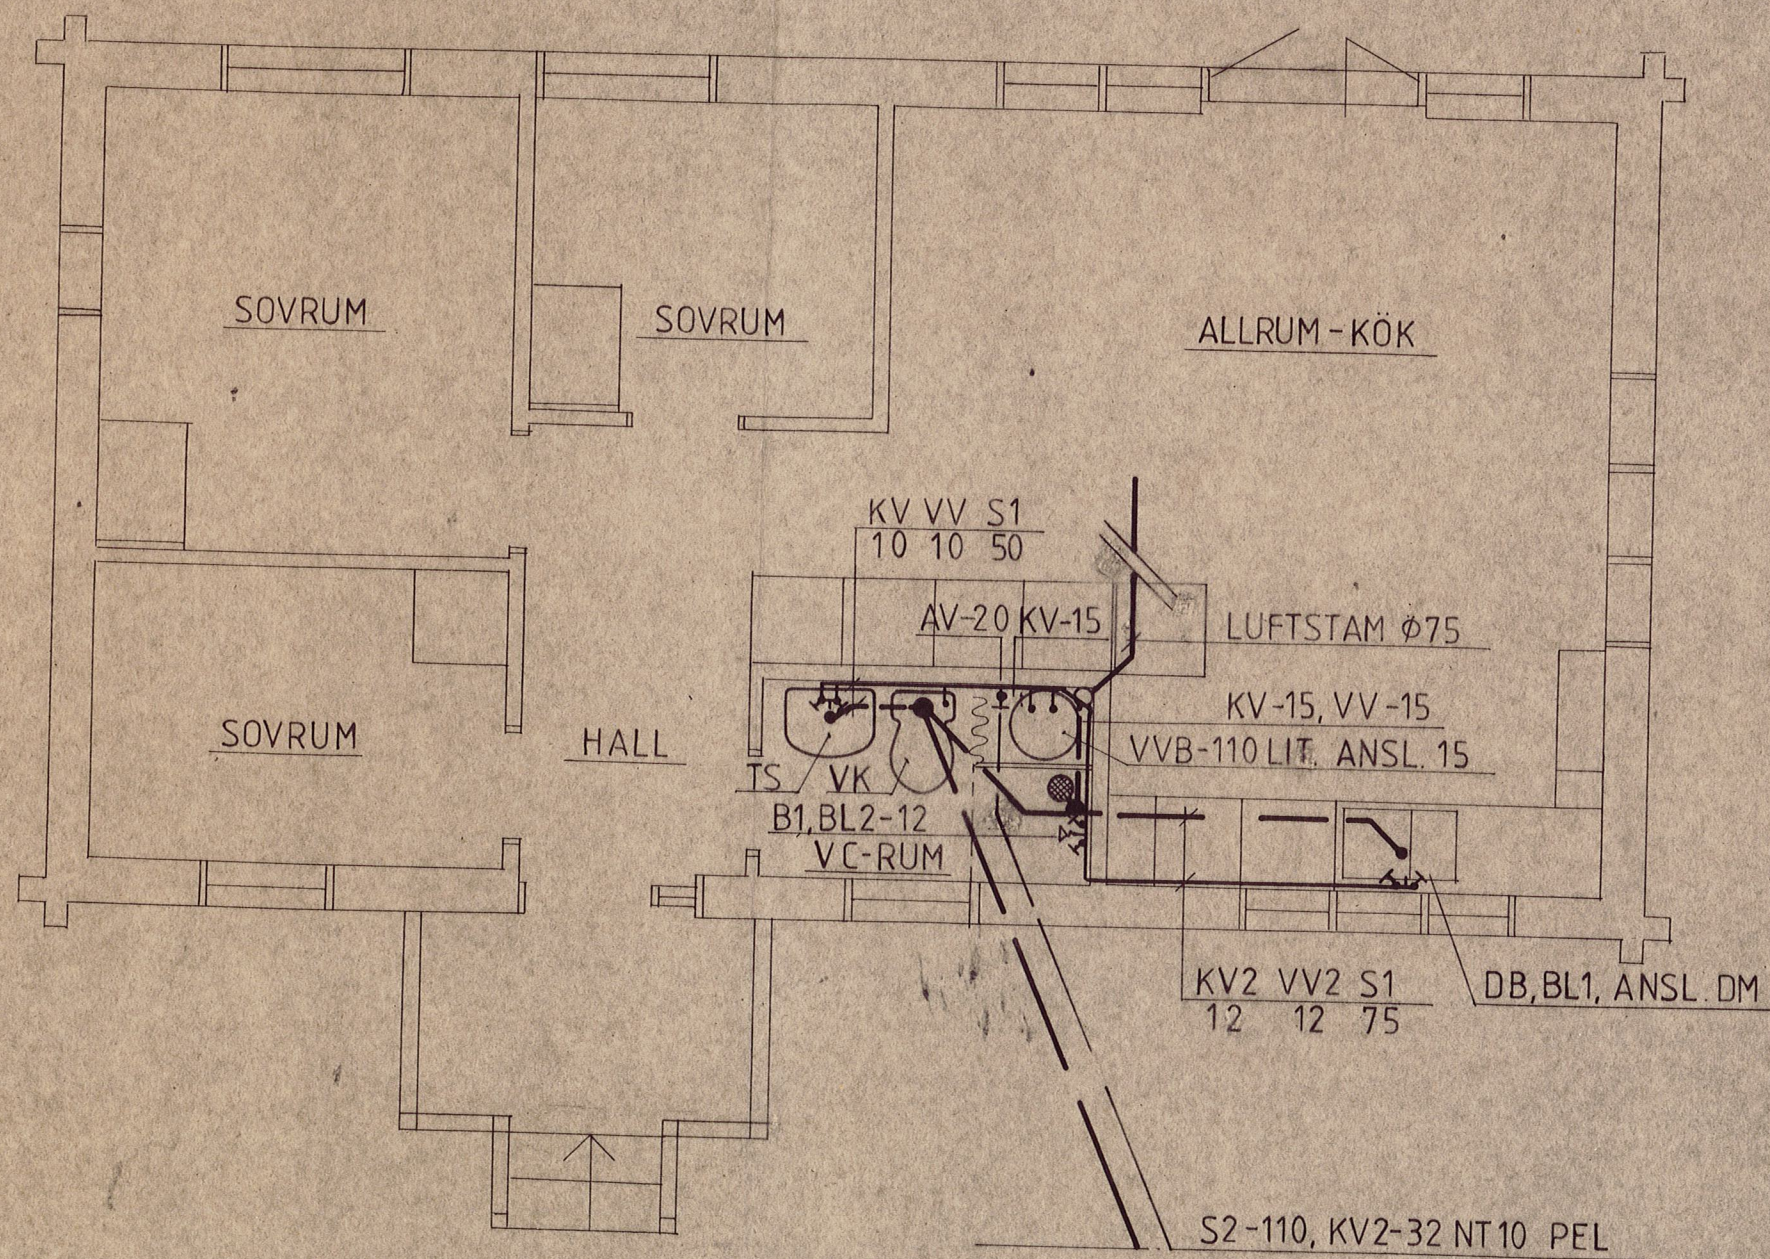

Ar 1982 den 5/10
godkänd enligt b
§ nr. 510 betyg

RÖR AB OLJA & S
820 95 FUNÄSDA
TEL. 0684-213 1

Ritad Konstruerad av Granskad av

1982.01.20



BESIKTNINGSBEVIS

Utskrivningsdatum

1984.05.16

Nummer

84/21

Ägare (namn och postadress)

Bertil Fahlström

Kungsgatan 18

111 35 Stockholm

HÄRIEDALENS KOMMUN

Byggnadsnämnden

84. 08. 08.

Dnr.

1984. 517 3011

Fastighet m m

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Postadress
Messlingen 3:50	820 95 Funäsdalen
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
Fritidshus	☒ nybyggnad ☐ ändring av byggnad
Ansvarig arbetsledare	

Täthetsprovning röckanal, avgaskanal

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar
84.05.10	☐ röckanal till värmepanna ☒ annan röckanal ☐ avgaskanal
Provningen är utförd	
☒ som röktryckprovning enligt SBN	☐ medelst annan av byggnadsnämnden godkänd metod
Enligt uppgift togs värmeanläggningen i bruk den	Skorstenens höjd, meter
	ca, 4m
	Över(Under)tryck vid provn. mm vp
	3mmvp
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	
☐ förmärktes	☒ förmärktes ej
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig
☐ finns ☒ finns ej	☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet

Täthetsprovning ventilationskanal

Provningen utförd (avslutad) den	Mättningsprotokoll nr

Särskilda iakttagelser m m

Skorstenen stagad med träregel på vinden, träregeln skall bort.
Imkanal saknas

Utlåtande

Eldstäder, rök-, avgas- och ventilationskanaler har undersökts ☐ utan erinran. ☒ med erinran enl ovan.

Kanaler har kontrollrensats.

(Skorstensfejarmästare)

Bastugatan 26 820 93 Hede Tel: 0684-11061

Gunnar Hjelm

(Post- och telefonadress)

AKTIEBOLAGET

OLJA & SANITET

Storgatan 102, 881 00 SOLLEFTEA

Telefon 0620/126 37, 143 42

Lager: Trästa Gård tel. 0620/144 11

Storgatan 58, 831 00 ÖSTERSUND

Telefon 063/12 53 20, 12 05 67

Lager tel. 063/10 10 34

Postgiro 57 73 59-3

Bankgiro 770-6898

● Hantverkshuset

● 820 95 FUNÅSDALEN

Telefon 0684/213 12



den



Provtryckningsprotokoll

Fastighet:

MESSLINGEN 3:50

Anläggning:

FRTIDSHUS

Datum:

30/13..... 1982

Tryckmedium:

VATTEN

Föreskrivet provningstryck:

10 atö

Fullt tryck:

10 atö kl. 30 MIN

Provtryckningen avbröts kl.

12.30

Ansvarig arbetsledare:

VVS-Ing. John Pettersson

Kontrollant:

John-Sören Hansson

Provtryckningen omfattar:

INRE KV, UV-LEDNINGAR

Provtryckningen godkännes

~~godkännes ej~~

Kontrollant

Plötskåpet
